

# 2022년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

【기준년도 : 2021년도】

(단위 : 백만원)

연번	사업명	사업개요	총사업비	담당부서
계	15개 사업			
1	섬진강 문화예술 다남길 조성사업	섬진강 미술촌, 한옥예촌, 향가마을 소울터널, 강변 예술쉼터 조성	6,000 (국 2,800, 군 3,200)	문화관광과
2	강천가는 오색단풍길 조성사업	오색단풍길 10.1km(테크로드, 단풍나무 식재 등), 수변쉼터, 포토존 등 조성	4,500 (도 2,250, 군 2,250)	문화관광과
3	도룡 재해위험 개선지구 정비사업	하천개수 L=0.84km, 교량 2개소 등	4,088 (국 2,044 도 817 군 1227)	안전재난과
4	경천고향의강 정비사업	교량 개설 2개소, 친수공간 조성 1개소 하천 정비 5.2km 등	22,607 (국 13,565, 도 4,521, 군 4,521)	안전재난과
5	온자실소하천 정비사업	하천 정비 1.7km	6,708 (군 6,708)	안전재난과
6	오류소하천 정비사업	하천 정비 2.2km	4,266 (군비 4,266)	안전재난과
7	지산~안정선(3공구) 도로 확포장공사	도로 확포장(2차선) L=3.06km, B=8.0m	8,470 (특600, 도300, 군 7,100)	건설과
8	섬진강 장군목생태관광지 활성화를 위한 진입도로 개설사업	도로 확포장 L=7.3km, B=8.0m	31,500 (균특 12,500, 군비 19,000)	건설과
9	서마권역 권역단위 정비사업	농촌문화센터 조성, 기초생활기반확충 등 지역경관개선	3,926 (균특 2,748, 도비 275, 군비 903)	농촌개발과
10	인계면 농촌증심지 활성화 사업	다시청춘관 조성, 으랏차차활동공간 조성, 쉼터조성, 지역역량강화 등	5,950 (국 4,165, 도 607.5, 군 1,177.5)	농촌개발과
11	섬진강 장군목 생태관광지 조성사업	생태로, 탐방길, 생태관광 체험장 등 조성	3,700 (균특 1,450 도 1,325 군 925)	환경수도과
12	순창 공공하수처리장 증설사업	증설 3,000m <sup>3</sup> /일(기존 5,100m <sup>3</sup> /일)	19,355 (국 5,878, 도 3,341.5 군 3,341.5 기타 6,794)	환경수도과
13	유기농산업복합센터 조성	오가닉샵, 유기농부마켓, 곤충사이언스관, 공공급식지원센터 등 조성	18,800 (국 9,000, 특 600, 도 2,700, 군 6,500)	생명농업과
14	순창 수체험센터 건립사업	수체험센터 1동, 온천관광정원	9,561 (국 4,500 도 2,250 군 2,771)	건강장수사업소
15	참살이 발효마을 조성사업	발효테라피센터, 누룩체험관, 다년생식물원, 전통음식거리 조성	19,700 (국 9,850 군 9,850)	장류사업소



# 섬진강 문화예술 다남길 조성사업

## 목 적

- 섬진강의 우수한 자연경관을 테마로 한 문화예술 볼거리 및 쉼터를 조성하여 다양한 관광자원 개발을 통한 지역경제 활성화

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2017 ~ 2022년(6년)
- 위 치 : 동계면 구미마을 ~ 적성면 평남리 ~ 유등면 오교리 ~ 풍산면 향가마을
- 총사업비 : 6,000백만원(국비 2,800, 군비3,200)
- 사업내용

세부사업	주요 사업 현황	비 고 (공정률)
한옥예촌(동계 구미)	마을입구 정비(한옥식 리모델링), 전시관 및 한옥정원 등	40%
섬진강 미술촌(적성 구남)	전시장, 주차장, 야외갤러리, 체험 및 편익시설, 쉼터 등	100%
강변예술쉼터(유등 오교)	예술쉼터, 편익시설 등	80%
향가 소울터널(풍산 향가)	무인공방, 터널 주변 정비 등	100%

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	6,000	1,708	1,288	1,500	1,504
국 비	2,800	654	644	750	752
특 별	0	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-
군 비	3,200	1,054	644	750	752

## ■ 2021년까지 추진실적

- ('15. 10.~11.) 지방재정 투자심사 완료 및 중기지방재정계획 반영
- ('18. 3.~'19. 6.) 기본 및 실시설계용역 완료
- ('19. 6.~'21. 5.) 향가 소울터널, 섬진강 미술촌(전시장 및 주차장)

- ('21. 6.) 섬진강 미술촌(전시장 내부 인테리어 및 쉼터 등), 강변예술쉼터, 한옥예촌(마을회관 한옥식 리모델링 등) 공사 착공

## ■ 향후 추진계획


- ('22. 2.~6.) 한옥예촌(전시관, 한옥정원 등) 실시설계용역 완료
- ('22. 5.) 섬진강 미술관 준공
- ('22. 9.) 강변예술쉼터, 한옥예촌(마을회관 한옥식 리모델링 등) 준공
- ('22. 7.~12.) 한옥예촌(전시관, 한옥정원 등)준공

## ■ 기대효과

- 기존 관광자원과 연계한 체류형 관광지로의 전환으로 지역경제 활성화 도모

## ■ 관련사진 첨부

[위치도]

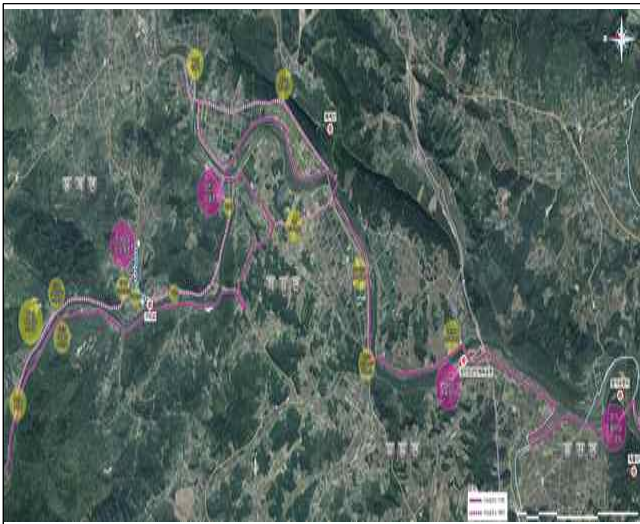

[완료전경 등]



(담당부서 : 문화관광과 관광자원개발계 오승택 주무관 ☎ 650-1632)

# 강천가는 오색단풍길 조성사업

## 목 적

- 순창의 대표관광지인 강천산 군립공원과 순창읍을 연계한 오색단풍길 조성을 통해 강천산 도보 접근성 확대 및 순창읍⇔강천산 쌍방향 관광코스 개발을 통한 관광객 유치 극대화

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020 ~ 2022년(3년)
- 위 치 : 순창읍 경천 ~ 팔덕면 청계리 강천산 일원
- 총사업비 : 4,500백만원(도비 2,250, 군비2,250)
- 사업내용 : 오색단풍길 10.1km(데크로드 포함), 수변쉼터, 포토존 등 조성

구분	구 간	연 장	주요사업 내용
	합 계	10.1km	
1코스	순창군청~대모암 입구	1.3km	종합안내판 설치 등
2코스	대모암~용두마을 입구	2.9km	데크길 950m, 전망대, 쉼터, 단풍나무(201주), 중력식 옹벽 65m 등
3코스	용두마을~찬물내기	1km	버스환승장, 단풍나무(80주), 쉼터, 찬물내기 소공원 리모델링 등
4코스	찬물내기~강천로 삼거리	2.5km	아치형 목교, 단풍나무(225주), 버스환승장, 쉼터 등
5코스	강천로 삼거리~강천산 입구	2.4km	데크길 270m, 버스환승장, 종합안내판 설치 등

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	4,500	-	400	2,000	2,100
국 비	0	-			
특 별	0	-			
도 비	2,250	-	200	1,000	1,050
군 비	2,250	-	200	1,000	1,050

## ■ 2021년까지 추진실적

- ('18. 10.~11.) 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투융자 심사 완료
- ('19. 5.~9.) 타당성 검토 및 기본계획 수립 완료

- ('20. 3.~9.) 강천가는 오색단풍길 실시설계용역 착공 및 준공
- ('20. 12.~'21. 6.) 데크쉼터(7개소) 및 차량정차대(8개소) 준공
- ('21. 5.) 데크산책로(600m), 전망대 등 착공

## ■ 향후 추진계획


- ('22. 3.) 데크산책로(600m), 전망대 등 준공
- ('22. 4.~12.) 데크산책로(620m), 버스환승장(3개소), 찬물내기 소공원 리모델링, 청단풍(506주) 식재 등 착공 및 준공

## ■ 기대효과

- 기존 관광자원과 연계한 체류형 관광지로의 전환으로 지역경제 활성화 도모

## ■ 관련사진 첨부

[위치도]

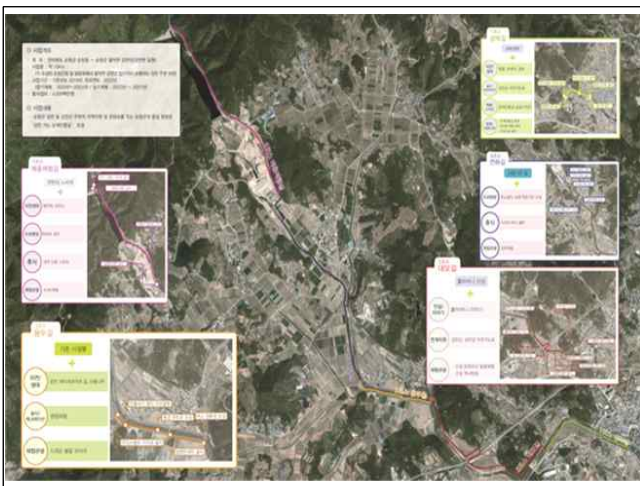

[완료전경 등]



(담당부서 : 문화관광과 관광자원개발계 오승택 주무관 ☎ 650-1632)

# 도룡 재해위험개선지구 정비사업

## 목 적

- 지방하천 양지천에 대해 하천기본계획에 따라 홍수방어 능력 증대를 통하여 침수피해를 해소하기 위함.

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 3. 25. ~ 2021. 6. 30.
- 위 치 : 순창군 인계면 쌍암리 868번지 일원
- 총사업비 : 4,088백만원(국비 2,044, 도비 817, 군비 1,227)
- 사업내용
  - 하천개수 L=0.84km, 교량 2개소, 낙차공 5개소 등

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	3,502	1,862	1,116	524	-
국 비	1,685	865	558	262	-
특 별	0	-	-	-	-
도 비	678	346	223	109	-
군 비	1,139	651	335	153	-

## ■ 2021년까지 추진실적

- 2021. 6. 30. 준공

## ■ 향후 추진계획

- 준공 완료에 따른 사업장 관리 철저

## ■ 기대효과

- 재해위험요인 해소로 지역주민의 생활환경 개선

## ■ 관련사진 첨부

[위치도]



[완료전경 등]



(담당부서 : 안전재난과 자연재난계 조예담 주무관 ☎ 650-1867)

# 경천 고향의 강 정비사업

## 목 적

- 경천의 치수 및 이수기능을 개선하고 생태기능을 복원함으로써 재해에 강한 자연친화적인 하천 조성

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2013 ~ 2021년(9개년)
- 위 치 : 순창군 풍산면 상촌리 ~ 유등면 건곡리 일원
- 총사업비 : 22,607백만원(국비 13,565, 도비 4,521, 군비 4,521)
- 사업내용
  - 하천 정비 5.2km, 지방도(730호선) 승상 1.7km
  - 교량 개설 2개소, 친수공간 조성 1개소

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	22,607	20,140	2,467	0	0
국 비	13,565	12,084	1,481	0	0
특 별	0	0	0	0	0
도 비	4,521	4,028	493	0	0
군 비	4,521	4,028	493	0	0

## ■ 2021년까지 추진실적

- 실시설계용역 착수 및 완료 : '13. 6. ~ '14. 10.
- 사업 착공 : '14. 12.
- 1차분 사업(배수로 정비) 완료 : '15. 12.
- 2차분 사업(건곡교 재가설) 완료 : '16. 5.
- 3차분 사업(지방도 정비) 완료 : '17. 9.
- 4차분 사업 완료(친수공간 조성) : '18. 9.
- 5차분 사업 완료(친수공간 및 가동보) : '19. 10.
- 순창교 재개설사업 착공 및 준공 : '20. 4. ~ '21. 6.

## ■ 향후 추진계획

○ 해당없음

## ■ 기대효과

○ 이·치수 개선으로 생태기능 복원 및 도로·농경지 침수 피해 예방

## ■ 관련사진 첨부

[위치도]



[완료전경 등]



(담당부서 : 안전재난과 하천계 권혁수 주무관 ☎ 650-1874)

# 온자실소하천 정비사업

## 목 적

- 이수 및 치수기능을 개선하여 도로 및 농경지 침수 피해 예방

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2017 ~ 2022년(6개년)
- 위 치 : 순창군 구림면 화암리 일원
- 총사업비 : 6,708백만원(군비 6,708)
- 사업내용
  - 하천 정비 1.7km

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	6,708	2,617	1,500	1,000	1,591
국 비	0	0	0	0	0
특 별	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0
군 비	6,708	2,617	1,500	1,000	1,591

## ■ 2021년까지 추진실적

- 실시설계용역 착수 및 완료 : '17. 1. ~ '19. 1.
- 소하천 정비 시행계획 공고 : '19. 4.
- 사업 착공 : '19. 12.

## ■ 향후 추진계획

- 사업 준공 : '22. 8.



# 오류소하천 정비사업

## 목 적

- 이수 및 치수기능을 개선하여 도로 및 농경지 침수 피해 예방

## 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년(5개년)
- 위 치 : 순창군 쌍치면 전암리 일원
- 총사업비 : 4,266백만원(군비 4,266)
- 사업내용
  - 하천 정비 2.2km

## 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	4,266	1,446	1,500	1,320	0
국 비	0	0	0	0	0
특 별	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0
군 비	4,266	1,446	1,500	1,320	0

## 2021년까지 추진실적

- 실시설계용역 착수 및 완료 : '17. 12~ '19. 4.
- 소하천 정비 시행계획 공고 : '19. 4.
- 사업 착공 및 준공 : '19. 6. ~ '21. 11.

## 향후 추진계획

- 해당없음

## 기대효과

- 이·치수 개선으로 도로·농경지 침수 피해 예방

## 관련사진 첨부

[위치도]



[완료전경 등]



(담당부서 : 안전재난과 하천계 권혁수 주무관 ☎ 650-1874)

# 지산~안정선(3공구) 도로 확포장 공사

## 목 적

- 군도 도로확포장을 통한 교통불편 해소와 도로망 확충으로 지역간 균형발전 도모

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 3 ~ 2021. 12
- 위 치 : 순창군 구림면 율북리 ~ 안정리 지내
- 총사업비 : 84.7억원(특별교부세 6억원, 도비3억, 군비 75.7억원)
- 사업내용 : 도로확포장(2차선) L=3.06km, B=8.0m

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	8,470	6,020	1,200	1,250	0
국 비	0	0	0	0	0
특 별	600	600	0	0	0
도 비	300	300	0	0	0
군 비	7,570	5,120	1,200	1,250	0

## ■ 2021년까지 추진실적

- 1차분 사업 착공 및 준공(라멘교 설치 1개소)
- 2차분 사업 착공 및 준공(V형 측구 196m, 산마루 측구 690m 등)
- 3차분 사업 착공 및 준공 (구조물옹벽, 송수관로 이설 등)
- 4차분 사업 착공 및 전체사업 준공(포장공 및 부대공)

## ■ 향후 추진계획


- 사업 준공(2021.12월)에 따른 도로 유지관리 추진

## ■ 기대효과

- 원활한 교통소통으로 주민편익증진 및 지역경제 활성화

## ■ 관련사진 첨부

[위치도]

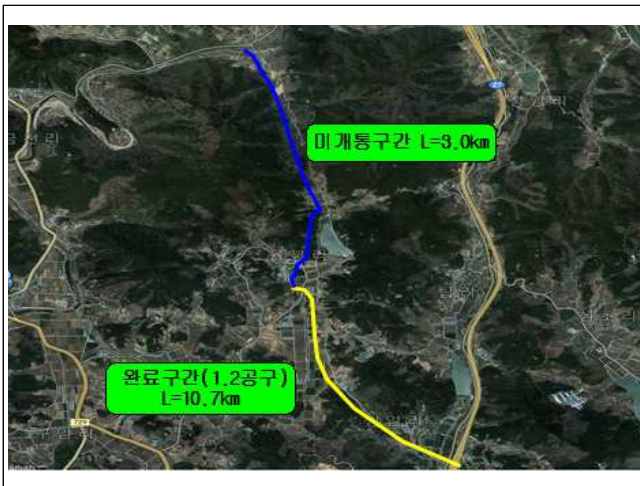

[준공식 등]



(담당부서 : 건설과 건설행정계 강승구 계장 ☎ 650-1811)

# 섬진강 장군목 생태관광지 도로개설 사업

## 목 적

- 섬진강 장군목을 찾는 관광객 증가에 대응하는 도로 서비스 및 교통편의 제공
- 홍수위선 상단으로 진입도로 개설하여 주민의 생명과 재산 보호

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 동계면 구미리 ~ 어치리
- 총사업비 : 31,500백만원(균특 12,500, 균비19,000)
- 사업내용 : 도로확포장 L=7.3km, B=8.0m
- 시행방식 : 공기관 위탁사업(전북개발공사)

-

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2021년	2022년	2023년이후
계(집행액)	31,500	8,470	4,466	1,564	17,000
균 특	12,500	7,045	4,060	1,395	-
균 비	19,000	1,425	406	169	17,000

## ■ 2021년까지 추진실적

- ('17.12월) 지역개발계획 승인고시(국토부)
- ('18.12월) 실시설계 용역착수
- ('19.03월~07월) 노선선정 협의(주민설명회, 순창군의회보고)
- ('19.08월~'20.11월) 전략환경영향평가(본안) 협의 등 노선확정
- ('21.02월~03월) 지역개발계획(변경) 협의 및 군도4호선 노선지정(변경) 승인
- ('21.07월) 3차 주민설명회 개최
- ('21.9월) 종점부 노선 변경 검토
- ('21.11월~ '22.03월) 변경노선 전략환경영향평가 변경협의완료(환경청)

## ■ 향후 추진계획


- ('22. 07월~09월) 지역개발사업구역 지정고시 및 실시계획 승인 등 행정절차 이행
- ('22.09월~11월) 토지보상 및 수용 추진
- ('22.12월~'24.12월) 사업 착수 및 완료

## ■ 기대효과

- 장군목 생태관광 활성화를 위한 도로를 개설하여 주민 통행편의 증진, 홍수시 통행안전 보장, 장군목과 용굴산을 찾는 관광객 증대에 따른 관광산업 활성화와 지역개발효과.

## ■ 관련사진 첨부

[위치도]

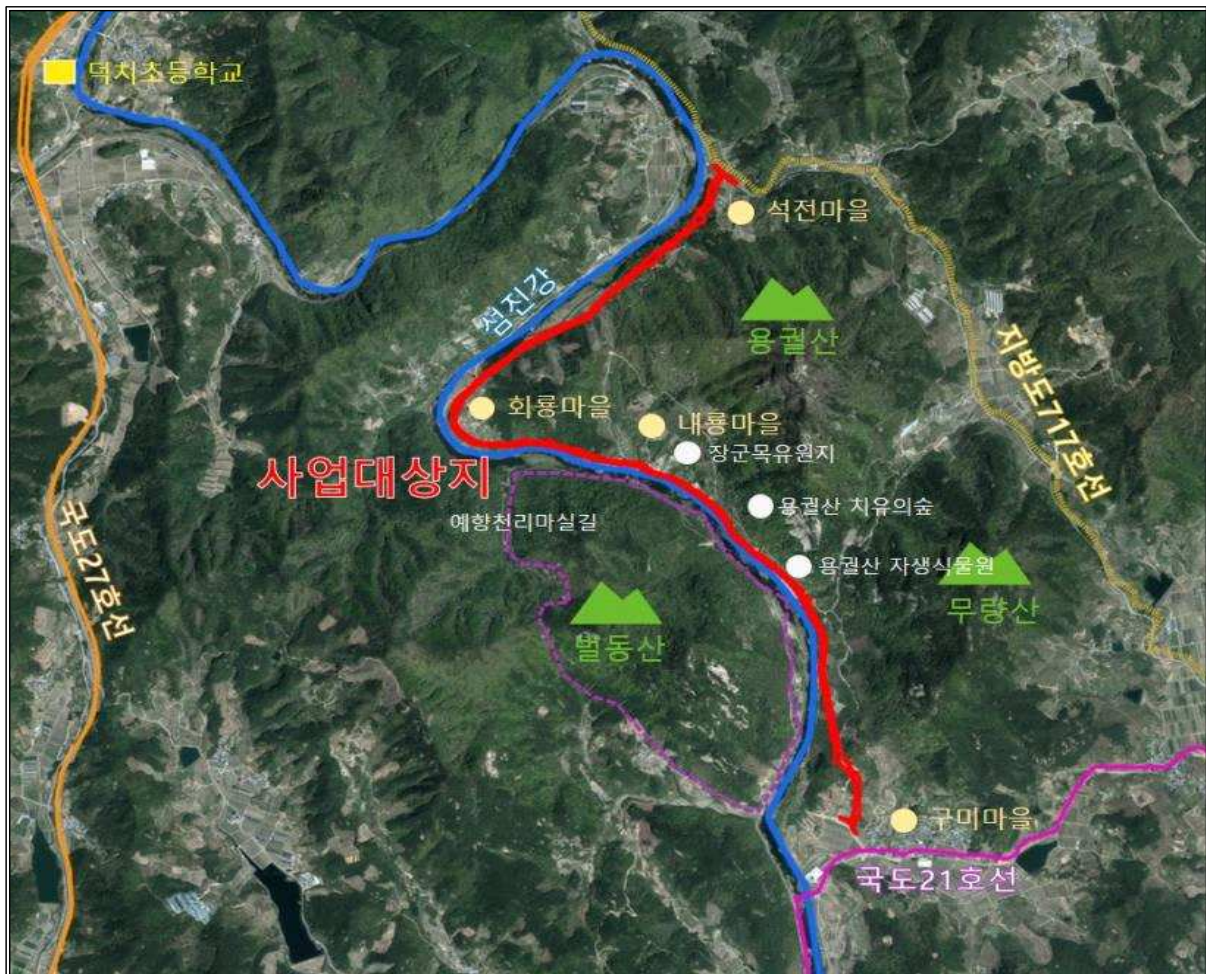

(담당부서 : 건설과 도시계획계 김다미 주무관 ☎ 650-1827)

# 서마권역 종합정비사업

## 목 적

- 농촌마을 경관 및 생활환경 개선으로 아름답고 살기 좋은 공간으로 정비
- 도농교류 촉진과 소득기반 조성으로 농촌관광 및 지역경제 활성화

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 위 치 : 순창군 북흥면 서마리(추령, 서지, 하마) 일원
- 총사업비 : 3,926백만원(군특 2,748, 도비 275, 군비 903)
- 사업내용
  - (기초생활기반) 농촌문화센터조성, 추령·하마마을회관 신축, 서지마을회관 및 진입로 정비 등
  - (경관개선) 서지마을 쉼터조성, 하마마을 주변 경관개선, 권역 안내판 설치
  - (역량강화) 교육, 컨설팅, 홍보 마케팅 등

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	3,926(3,926)	1396.6(1396.6)	1,290(1,290)	1239.4(1,239.4)	-
국 비	-	-	-	-	-
특 별	2,748.1	977.6	903	867.5	
도 비	274.6	97.8	90	86.8	
군 비	903.3	321.2	297	285.1	

## ■ 2021년까지 추진실적

- (2018.03.19.) 공기관대행 위수탁계약 체결
- (2019.11.21.) 기본계획 승인 및 고시
- (2021. 6.) 시행계획 승인(조건부포함)· 고시
- (2021.10.) 추령마을회관 등 공사 착수

## ■ 향후 추진계획


○ (2022.12.) 사업 준공

## ■ 기대효과

○ 도농교류 촉진과 소득기반 조성으로 농촌관광 및 지역경제 활성화

## ■ 관련사진 첨부

[위치도]

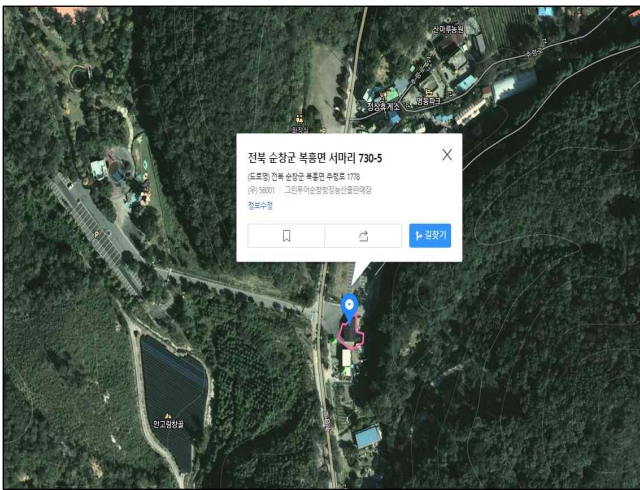

[조감도]



(담당부서 : 농촌개발과 1사1촌 T/F 이정원 주무관 ☎ 650-1757)

# 인계면 농촌중심지활성화사업

## 목 적

- 농어촌지역의 거점공간인 면 중심지에 교육, 문화, 복지시설 등 주민이 이용 가능한 적정 수준의 시설을 갖추으로써 거점기능 강화 및 기초 서비스 기능 향상 도모

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2022. 6.
- 위 치 : 순창군 인계면 도룡리 1390번지 일원
- 총사업비 : 5,950백만원(국비 4,165, 도비 607.5, 군비 1,177.5)
- 사업내용
  - 생활기반확충 : 다시청춘관 조성 610㎡, 으랏차차활동공간 조성 2,328㎡, 무장애환경 조성 443m, 헬스케어방 조성 107㎡, 다시청춘 귀농거점 조성 2동, 빨래터&꾸밈터 1동
  - 지역경관개선 : 중심지쉼터 조성, 다시청춘길 조성
  - 지역역량강화 : 기본 및 시행계획, 교육·선진지 견학 등

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	5,950	2,069.9	1,940	1,940.1	-
국 비	4,165	1,449	1,358	1,358	-
특 별	0	-	-	-	-
도 비	607.5	257.5	175	175	-
군 비	1,177.5	363.4	407	407.1	-

## ■ 2021년까지 추진실적

- 2018.06.11. 공기관 대행 위수탁 협약 체결(전북개발공사)
- 2019.07.30. 기본계획 승인 및 고시
- 2020.05.15. 시행계획 수립 완료 / 고시
- 2020.08.10. 다시청춘관 조성 등 사업 착공
- 2021.12월 다시청춘관 조성 등 사업 준공

## ■ 향후 추진계획


- 2022.6월 세탁봉사센터 준공 및 인수인계
- 2022.7월 사업 준공 고시

## ■ 기대효과

- 교육, 문화, 복지시설 등 주민이 이용 가능한 적정 수준의 시설조성  
으로 거점기능 강화 및 기초서비스 기능 향상 도모

## ■ 관련사진 첨부

[위치도]

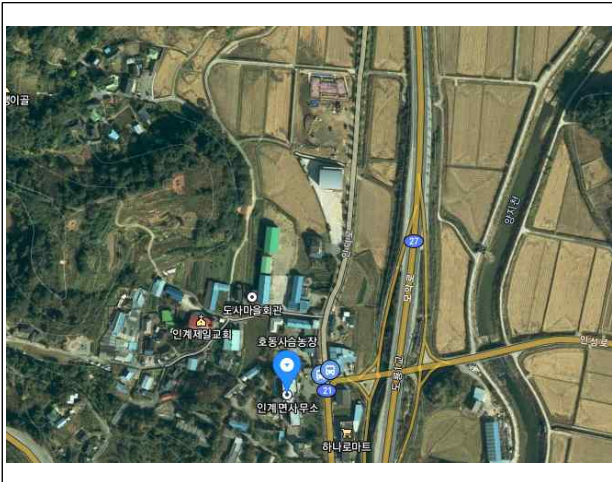

[완료전경 등]



(담당부서 : 농촌개발과 소도읍개발계 오병욱 주무관 ☎ 650-1766)

# 섬진강 장군목 생태관광지 조성사업

## 목 적

- 섬진강 장군목의 우수한 생태자원인 요강바위와 배롱나무를 활용한 생태관광 명소화

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2016 ~ 2022
- 위 치 : 섬진강 장군목 일원
- 총사업비 : 3,700백만원(균특 1,450 도비 1,325 군비 925)
- 사업내용
  - 생태로, 탐방길 생태관광 체험장 등 조성

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	3,700	2900	400	400	0
균 특	1,450	1450		0	0
도 비	1,325	725	300	300	0
군 비	925	725	100	100	0

## ■ 2021년까지 추진실적

- 2016 수변 생태로 조성공사 : 이팝나무 외 1,494주 식재
- 2017년 신비한 요강바위 탐방길 조성사업 : 요강바위 관찰 징검다리 및 안내판 설치 및 초화류 식재
- 2018년 구암정주변 생태자원 관찰로 정비 : 관찰로 계단정비 및 백일홍서식지 500m 복원
- 2019년 섬진강 장군목 생태오두막쉼터 조성사업 : 쉼터 8개동 및 배롱나무 식재 214주

- 2020년 순창군 섬진강 장군목 생태관광 에코전시공간 조성사업 : 용결산 자연휴양림 변경승인 행정절차 이행중

## ■ 향후 추진계획

- 2022년 12월 : 순창군 섬진강 장군목 생태관광 에코전시공간 조성 완료

## ■ 기대효과

- 섬진강의 생태자원을 발굴 생태관광을 활성화함에 따라 관광객 유인 및 생태관광자원을 활용한 체험프로그램 등을 통해 주민 소득 증대

## ■ 관련사진 첨부

[위치도]



[완료전경 등]

	
<p>수변생태로 조성</p>	<p>수변생태로 조성</p>
	
<p>신비한 요강바위 탐방길 조성</p>	<p>신비한 요강바위 탐방길 조성</p>
	
<p>구암정주변 생태자원 관찰로 정비</p>	<p>구암정주변 생태자원 관찰로 정비</p>
	
<p>섬진강 장군목 생태오두막쉼터 조성</p>	<p>섬진강 장군목 생태오두막쉼터 조성</p>

(담당부서 : 환경수도과 환경정책계 정진완 주무관 ☎ 650-1722)

# 순창 공공하수처리장 증설사업

## 목 적

- 공공하수처리시설 증설로 하천오염방지 및 깨끗한 주거 환경 조성

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2025년(6년)
- 위 치 : 유등면 향가로 65
- 총사업비 : 19,355백만원(국비 5,878, 도비 3,341.5, 군비 3,341.5, 기타 6,794)
- 사업내용
  - 처리용량 3,000m<sup>3</sup>/일 증설

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	19,355	-	950	-	18,405
국 비	5,878	-	324	-	5,554
도 비	3,341.5	-	162	-	3,179.5
군 비	3,341.5	-	464	-	2,877.5
기 타	6,794	-	-	-	6,794

## ■ 2021년까지 추진실적

- ('19. 6.) 기본 및 실시설계용역 착수
- ('20. 7.) 하수처리공법 선정
- ('21. 2.) 설계 VE용역 및 설계안정성 검토용역 완료
- ('21. 12.) 실시계획인가(변경) 등 관련 인·허가 협의 완료
- ('21. 12.) 소규모 지하안전영향평가 용역 및 도 기술심의 완료

## ■ 향후 추진계획


- ('22. 3.) 전북도 설치인가 신청
- ('22. 4.) 전북지방 환경청 재원협의
- ('22. 7) 전북도 설치인가 완료
- ('22. 7) 원가심사 및 공사 발주

## 기대효과

- 하수와 분뇨를 적정하게 처리하여 지역사회에 지속가능한 발전과 공중위생의 향상에 기여

## 관련사진 첨부

[위치도]

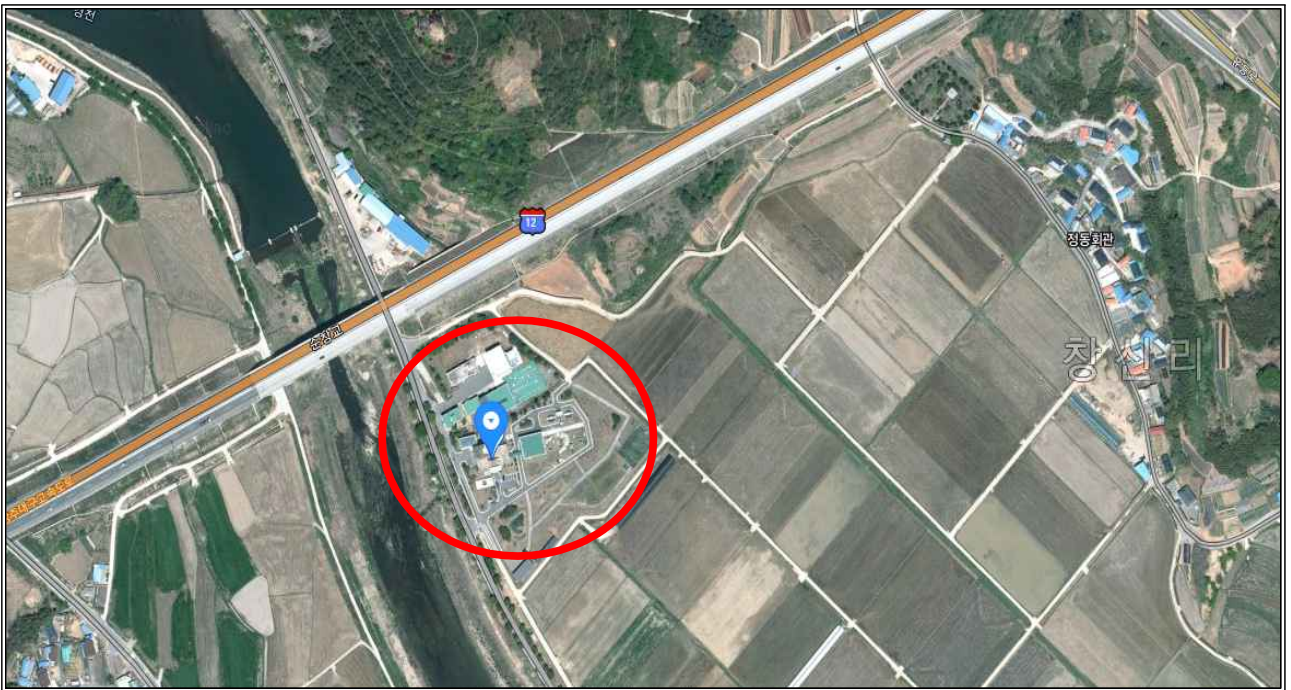

(담당부서 : 환경수도과 하수도계 김민수 주무관 ☎ 650-1743)

# 순창군 유기농산업복합센터 조성사업

## 목 적

- 유기농 테마 체험·힐링 공간 조성하여 순창군 친환경농업 위상 제고
- 가공 창업공간 마련으로 유기농업 신소득분야 창출 및 지역경제 활성화

## 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~2023.(4년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 백산리 586번지 일원(발효테마파크 내)
- 총사업비 : 18,000백만원(국비 9,000, 특별 600, 도비 2,700, 군비 5,700)
- 사업내용
  - 오가닉샵, 유기농부마켓, 곤충사이언스관, 아티스트카페, 공공급식 지원센터, 오가닉레스토랑 등

## 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	18,800	800	1,000	5,100	11,900
국 비	8,400	-	500	2,550	5,950
특별	600	-	-	600	-
도 비	2,700	-	150	765	1,785
군 비	6,500	800	350	1,185	4,165

## 2021년까지 추진실적

- ('20.4.) 전라북도 지방재정 투융자 심사 완료
- ('20.12.) 군 공공건축심의회 완료
- ('21.3.) 계획 및 실시설계용역 추진
- ('21.7.) 농림부 기본계획 최종 승인
- ('21.12.) 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료
- ('21.12.) 유기농업 VR 콘텐츠 개발 용역 추진

## ■ 향후 추진계획

- ('22.1.) 조달청 설계적정성 및 경제성 검토 추진
- ('22.2.) 군 건축 인허가 추진
- ('22.4.) 지방건설기술심의 및 전라북도 시행계획 수립
- ('22.6.) 공사 계약 추진
- ('22.8.) 공사 착공 및 기공식 추진
- ('23.12.) 공사 준공

## ■ 기대효과

- 소비자 인식 제고 및 소비 촉진을 위해 유기농 소비체험·교육·홍보 등 원스톱 서비스를 제공하는 복합단지 조성

## ■ 관련사진 첨부

[위치도]



[완료전경 등]



(담당부서 : 생명농업과 기술보급계 이현 주무관 ☎ 650-5623)

# 순창 수(water) 체험센터 건립사업

## 목 적

- 음용온천수 등 천연자원을 활용 건강과 관광이 융합된 새로운 관광산업 창출
- 온천수 활용 질병예방적 차원의 수(水)체험 프로그램 운영으로 국민건강증진에 기여

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2016. ~ 2022.
- 위    치 : 순창군 팔덕면 청계리 839 일원
- 총사업비 : 9,561백만원(국비4,500, 특별40, 도비2,250, 군비2,771)
- 사업내용 : 수체험센터 1동(2,904.57㎡), 온천관광정원 1식
  - 수체험센터 : 치유누리실, 도반욕실, 족욕CAFE, 편백수면실, 스넥바, 사우나실, 샤워장 등
  - 온천관광정원 : 온천 족욕장, 노천탕, 동굴형 체험관, 산책로 등

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	9,561	9,121	400	40	
국 비	4,500	4,500	0	0	
특 별	40	0	0	40	
도 비	2,250	2,250	0	0	
군 비	2,771	2,371	400	0	

## ■ 2021년까지 추진실적

- ('15. 7.) 지방재정 투자심사 완료
- ('17. 7.) 실시설계 완료
- ('17. 10.) 수(water)체험센터 건립사업 착공
- ('21. 6.) 수(water)체험센터 네이밍(명칭) 공모 → '강천힐링스파'로 선정

## ■ 향후 추진계획

- ('22. 3.) 수(water)체험센터 건립사업 준공
- ('22. 4.) 수(water)체험센터 개장 및 운영개시

## ■ 기대효과

- 건강과 관광이 융합된 새로운 관광산업 창출로 체류형 관광객 증대 및 온천수 활용한 수(water)체험 운영으로 군민건강 증진

## ■ 관련사진 첨부

[위치도]



[완료전경 등]



(담당부서 : 건강장수사업소 건강산업계 이재훈 주무관 ☎ 650-1531)

# 참살이 발효마을 조성사업

## 목 적

- 순창장류산업은 국내 장류총생산의 36%를 차지하고 있으나, 산업위주의 성장으로 중장기 성장동력 한계
- 문화, 관광의 융복합화를 통해 전통식품산업의 활성화와 농업소득 증가, 고용창출을 연계함으로써 전통발효문화산업의 거점 조성

## ■ 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2022년(6년)
- 위 치 : 전북 순창군 순창읍 백산리(장류특구 일원)
- 총사업비 : 19,700백만원(국비 9,850, 군비 9,850)
- 사업내용 : 발효테라피센터, 누룩체험관 , 다년생 고추식물원, 전통음식 거리 등 조성

## ■ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분 재원별	총사업비	기투자	2020년	2021년	2022년이후
계(집행액)	19,700	2,800	5,070	11,830	0
국 비	9,850	1,400	2,535	5,915	0
군 비	9,850	1,400	2,535	5,915	0

## ■ 2021년까지 추진실적

- 서부내륙권광역관광개발계획 기본계획 수립 : '15. 04.
- 단지조성 설계용역 착수 : '17. 04
- 참살이발효마을 기본계획 수립 착수 : '17. 11
- 참살이발효마을 마케팅전략 및 시설운영계획 용역 발주: '17. 12
- 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰 : '18. 05

- 기본 및 실시설계용역 원가심사 의뢰 : '18. 10
- 참살이발효마을 건축설계 공모 : '18. 10
- 참살이발효마을 건축설계 공모 업체선정 : '18. 12
- 기본 및 실시설계 용역 착수 : '19. 01
- 기본 및 실시설계 용역 완료 : '19. 12
- 조달청 설계 적정성 검토 완료 : '20. 04
- 전라북도 건설기술심의 완료 : '20. 05
- 참살이발효마을 공사착공 : '20. 08
- 사업계획 변경 승인(사업기간 등) : '21. 10

### ■ 향후 추진계획

- 참살이발효마을 공사완료 : '22. 10

### ■ 기대효과

- 산업과 관광이 융합된 단지 조성으로 지역경제 활성화, 500만 관광객 유치

### ■ 관련사진 첨부

[조감도]



[전경사진]



(담당부서 : 장류사업소 선도지구계 조동진 주무관 ☎ 650-5476)
